




Neubau Badi Salez

Statusbericht Nr. 2 vom 18. September 2026

Diese Woche starten die Schneidarbeiten im Becken, welche eine Woche dauern. Ausserdem wird der Tiefbrunnen (Grundwasserabsenkung) gebohrt. Die Firma Marty unterbricht diese Woche die Aushubarbeiten aufgrund der engen Platzverhältnisse (Kran und Bohrgestänge) auf der Baustelle.

In dieser Woche wird mit der Bohrung für den Tiefenbrunnen begonnen (bis ca. 10 Meter Tiefe).

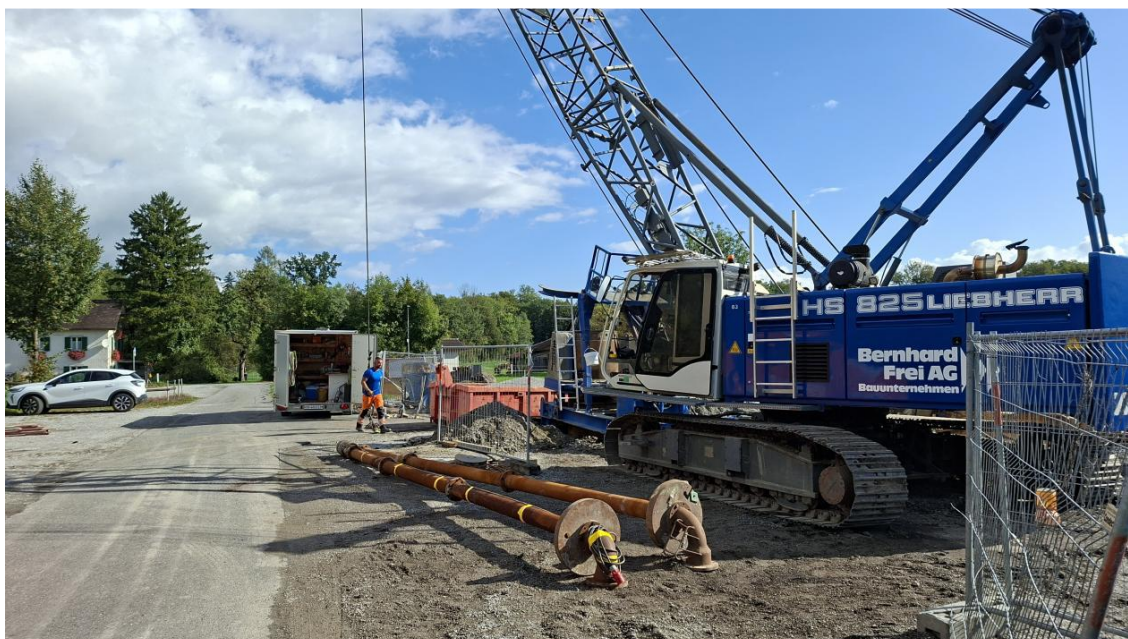

Die Schneid- und Rückbauarbeiten starten ab dem 21.09.2026.



Aufgrund der Bohrarbeiten hat die Firma Marty mit dem Aushub pausiert. Ab nächster Woche werden die Arbeiten wieder aufgenommen.

