Neubau Badi Salez

Statusbericht Nr. 5 vom 23. Oktober 2026

In der Woche 42 wurden die Grabarbeiten für das Technikgebäude und die Kanalisation fertig ausgeführt. Die Firma HSH Installationstechnik AG verlegte danach die Kanalisationsleitungen auf die Hebeanlage.


Die Hebeanlage für die Entwässerung vom Technikraum wurde gesetzt und einbetoniert. Dank der Grundwasserabsenkung drang kein Wasser in die Baugrube ein. Als nächstes ist das Betonieren der Bodenplatte geplant.



Am 15. Oktober 2026 wurden die Kanalisationsleitungen in die Leitungsgräben verlegt.




Die Dimension vom Aushub für den Technikraum ist auf diesem Foto schön zu sehen.

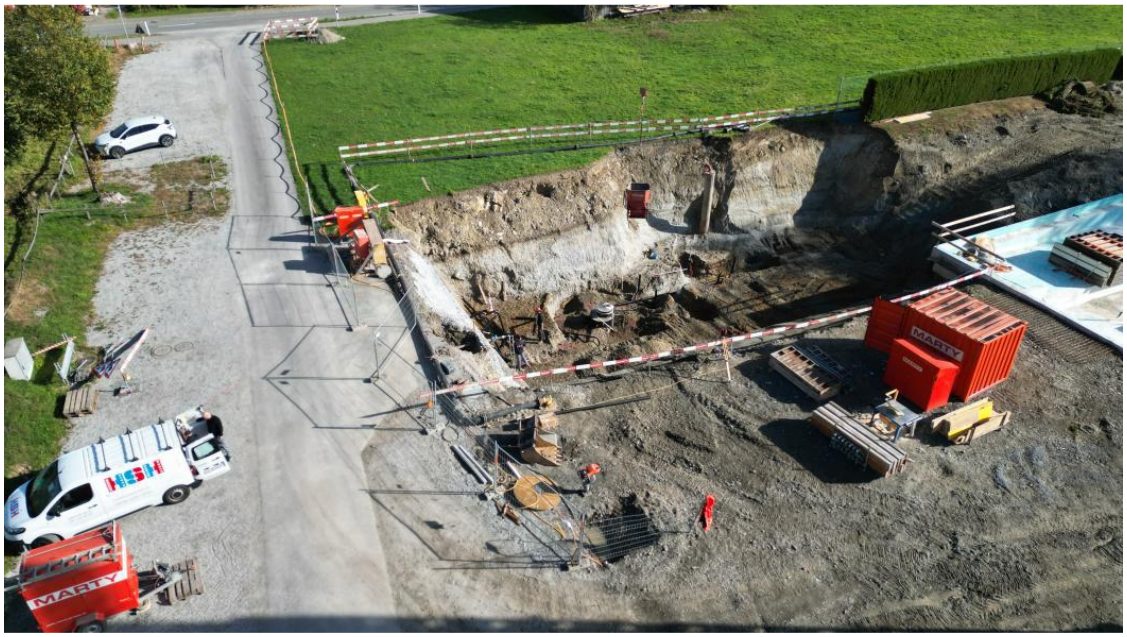


In der Woche 43 wurden die Schneid- und Bohrarbeiten im Schwimmerbecken fortgesetzt und die Bodenplatte für den neuen Technikraum betoniert. In der kommenden Woche beginnen die Arbeiten für die Wände des Technikraums.

Die Abdichtung für die Bodenplatte vom Technikraum wurde verlegt und die Durchdringungen (Bodenabläufe) abgedichtet. Die Bodenplatte wurde am 23. Oktober 2026 betoniert.

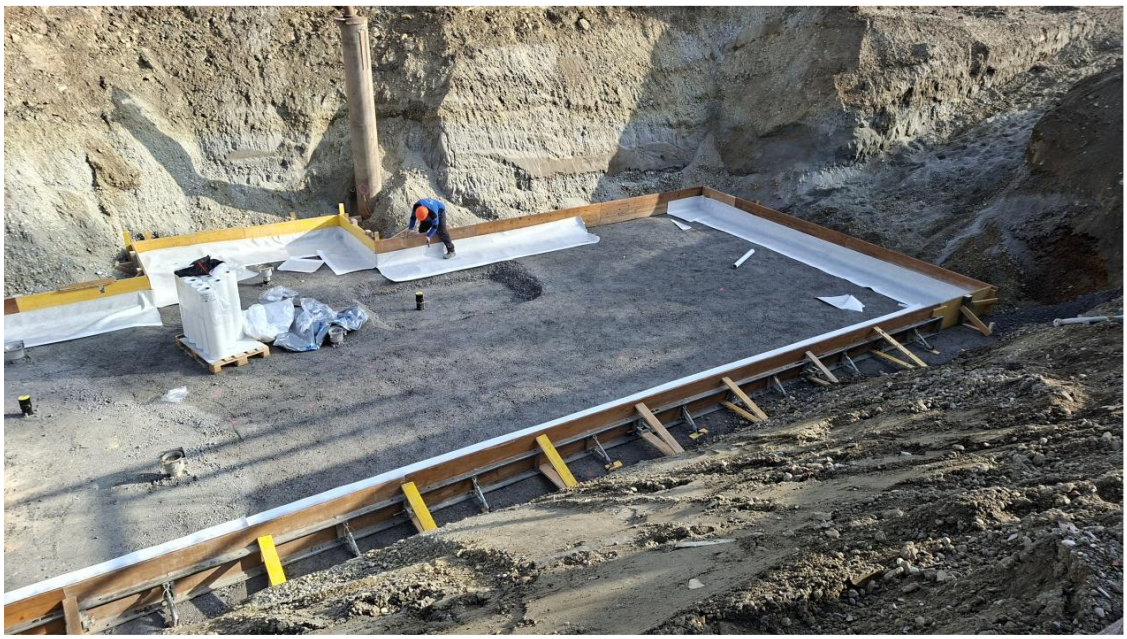

Am 26. Oktober 2026 wird der 35'000 Liter Grauwassertank aus Deutschland angeliefert.

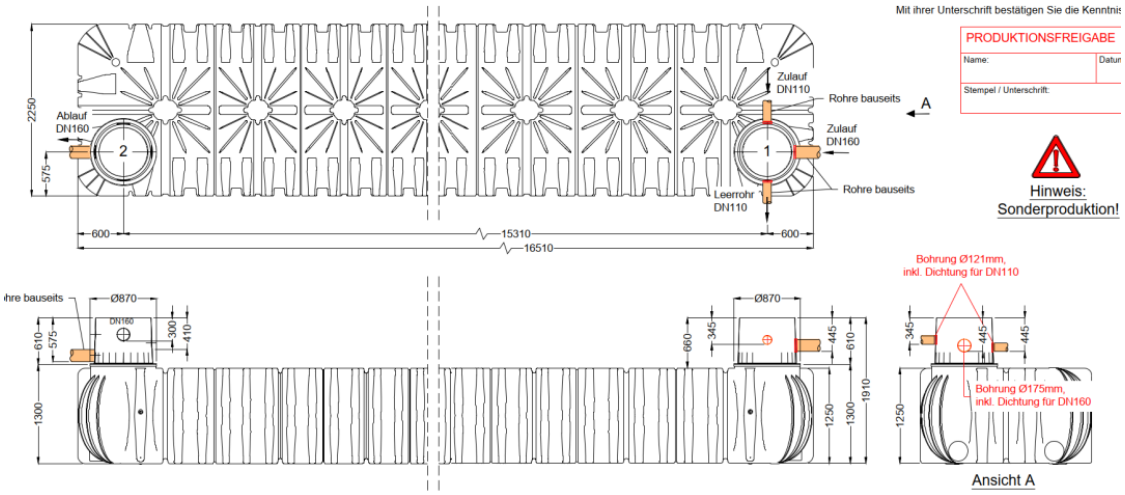

Im Schwimmerbecken wurde mit den Bohrungen für die Anschlusseisen begonnen (Bodenkanalsockel).

